



INFORMACIÓN

www.informacion.es

Este diario utiliza papel reciclado al 80,5%

ALICANTE

El sobrecoste de materiales fuerza a las constructoras a abandonar una veintena de obras en la provincia

▶ Las empresas **dejan desiertas** las licitaciones o **renuncian a proyectos** contratados sin terminar al aumentar el presupuesto un 30% ▶ Actuaciones por valor de **30 millones** están bloqueadas **P 4 y 5**

Trabajos de fin de grado, a la venta

▶ WEBS OFRECEN REDACTAR PROYECTOS POR ENTRE 400 Y 1.000 EUROS **P 12 y 13**

e&e activos

La UE, salvavidas para la pesca

▶ Un 15% más de ayudas al sector para compensar el recorte de días de salir a faenar

P Cuadernillo central

arte & letras

El primer gran éxito de Alice Munro

▶ LA PREMIO NOBEL ESCRIBIÓ SOBRE LA GENTE CORRIENTE EN «DANZA DE LAS SOMBRAS»

Suplemento P 51 a 62

HOY, CON INFORMACIÓN

La actualidad de los barrios y pedanías de Alicante



PERFECTO ARJONES

Los fuegos se celebraron en la plaza del Mar.

La mascletá, diez años en el punto de mira

▶ EL AYUNTAMIENTO DECIDIÓ EN 2013 EL TRASLADO POR EL DETERIORO DE LA FUENTE PERO DIO MARCHA ATRÁS **P 6 y 7**

Los análisis del domingo

FUEGOS ARTIFICIALES, CUANDO TOQUEN

por Juan R. Gil **P 2 y 3**

LUCEROS NO ESTÁ PARA TIRAR COHETES

por Manuel Alcaraz **P 34 y 35**



HÉCTOR FUENTES

Una multitud en la mascletá celebrada este sábado en Gran Vía.

Con ganas de pólvora

▶ La primera mascletá de Hogueras en tres años congrega a cientos de personas en un espectáculo pirotécnico de 80 kilos de explosivos en Gran Vía **P 8**



EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO. POR SUERTE, TÚ TAMBIÉN.

Cada vez somos más quienes, en la Comunitat Valenciana, nos hemos comprometido a cambiar nuestros hábitos para frenar la crisis climática. Tú formas parte de ese cambio. De un clima compartido capaz de inspirar a millones.




Únete a

#CLIMASPARAELCAMBIO

www.climasparaelcambio.es



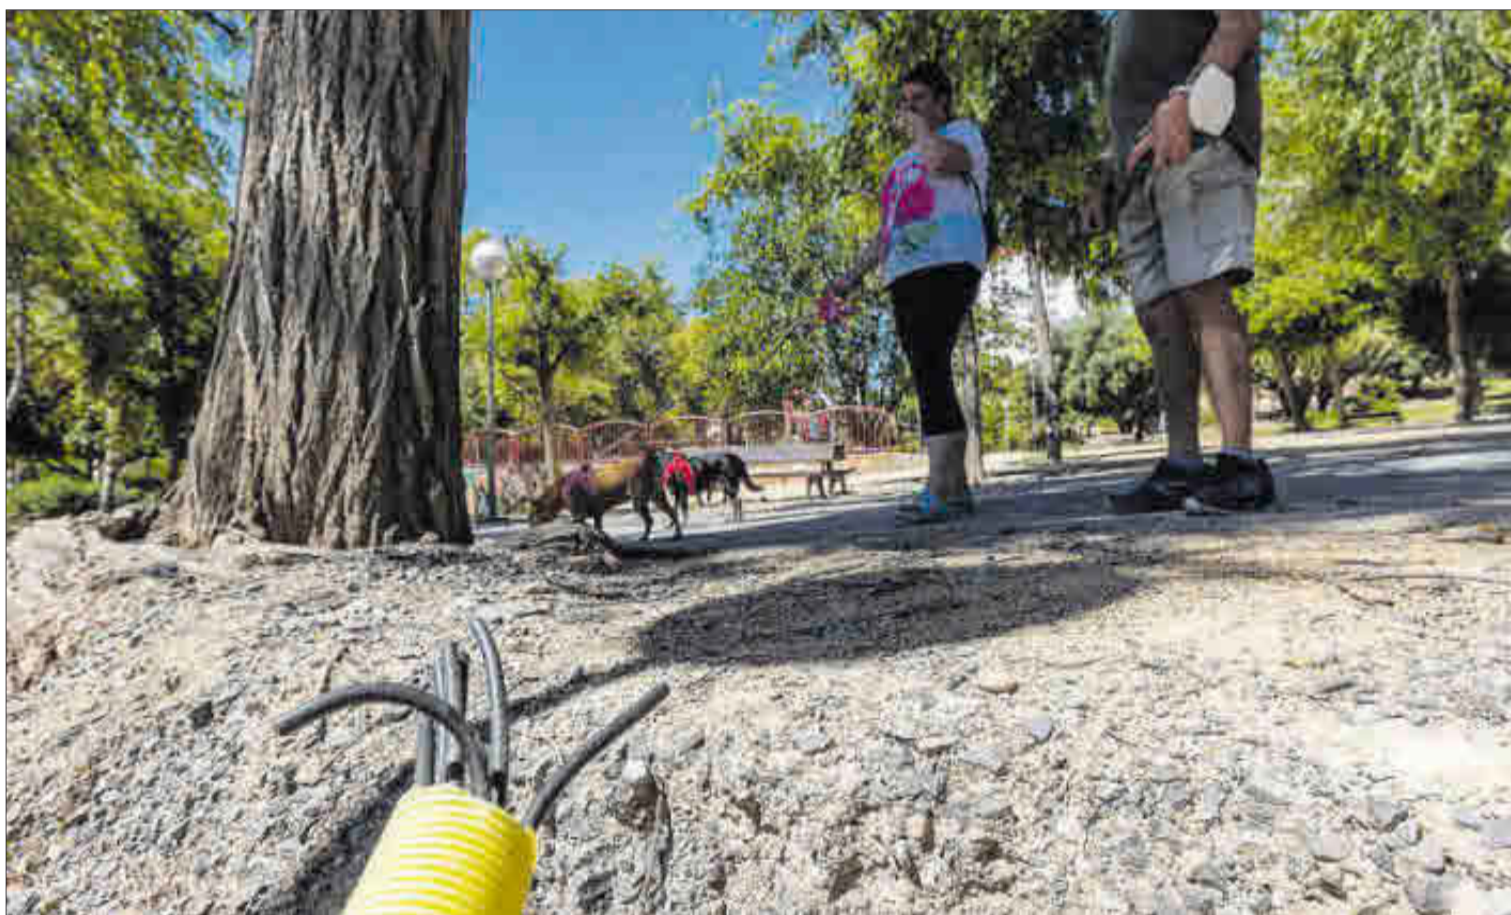

Aspecto que presenta el parque Lo Morant de Alicante tras permanecer medio año lleno de zanjas por unas obras interrumpidas.

JOSE NAVARRO

LAS CIFRAS

6

Meses en los que se han superado las cifras de renuncia de hace 12 años

► FOPA advierte de que en los últimos seis meses se han producido más renuncias o han quedado más concursos desiertos en obra pública que en los últimos 12 años.

4

Proyectos desbloqueados por la UMH tras la revisión

► La UMH ha optado por actualizar los precios de sus obras y así ha adjudicado cuatro de los cinco grandes proyectos de su Campus.

Las constructoras abandonan una veintena de obras públicas en la provincia por el sobrecoste

► Las empresas renuncian a los proyectos contratados o dejan desiertas las licitaciones al dispararse el presupuesto un 30% ► Actuaciones por valor de 30 millones están bloqueadas

PÉREZ GIL

■ Obras paradas sin acabar, proyectos adjudicados que se retrasan, renuncias a contratos aún perdiendo la fianza, convocatorias desiertas... Así está la obra pública en la provincia de Alicante. Hay al menos una veintena de proyectos de entidad afectados con una inversión en el limbo que ronda los 30 millones de euros. La razón de esta paralización que, en mayor o menor grado afecta a todas las comarcas alicantinas, se debe al encarecimiento de los proyectos en un 30% debido al incremento que el precio de los materiales de construcción -madera, acero y aluminio fundamentalmente- ha experimentado desde el año 2021. Una situación de «tormenta perfecta» que se ha visto agravada en los seis últimos meses por la inflación que ha generado la guerra de Ucrania unido a un coste desproporcionado de la energía en España y la subida de los costes del transporte internacional.

El beneficio medio de las empresas dedicadas a la obra pública es del 4%. Un escaso margen que,



Recreación virtual del pabellón de Xixona, cuya licitación de obra permanece desierta.

INFORMACIÓN

sin embargo, se torna en pérdidas por el desfase entre el presupuesto con el que se adjudicaron los proyectos el año pasado y el valor de mercado actual. Una circunstancia que está llevando incluso a


las constructoras a renunciar al aval o a la fianza depositada en las diferentes Administraciones Públicas. «En estos casos la disyuntiva a la que nos enfrentamos es perder el 3% del aval o el 5% de la fianza

o tener que echar el cierre en la empresa porque un 30% de sobrecoste es completamente inasumible en un sector como el nuestro que, además, tiene un beneficio tan reducido», explica Javier Gis-

bert, presidente de FOPA, la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante.

Precisamente en la ciudad de Alicante al menos una decena de obras públicas promovidas por el Ayuntamiento están paralizadas o sufren retrasos. Uno de los casos más llamativos afecta al parque Lo Morant, que lleva medio año lleno de zanjas por unas obras interrumpidas. El gobierno bipartito que forman PP y Ciudadanos optó el pasado mes de abril por resolver el contrato con la empresa a la que se adjudicó el proyecto de regeneración del espacio porque, en los cuatro meses de ejecución pactados, solo habían realizado un 2% de los trabajos previstos. Lo justo para sacar varios camiones llenos de escombros con los restos de los bordillos que separaban el césped y las zonas de paseo, que fueron arrancados en buena parte del recinto, dejando decenas de zanjas abiertas. Al respecto, el Ayuntamiento recuerda que la empresa «a la fuga» abandonó el contrato por la subida del precio de los materiales y que ahora se están coordinando las acciones para retomar los trabajos, que incluirán acabar lo que resta para renovar infraestructuras y una mejora paisajística, para lo que se destinarán otros 340.000 euros de remanentes. De momento no hay mercantil aunque está en marcha el proceso para contratar una nueva.

Otro caso es el del mercado municipal de Carolinas. Las obras de reforma se prolongarán cinco meses tras aceptar el equipo de gobierno la petición de la empresa, que debería haberlas terminado ya, al justificar atrasos en los plazos de entrega de determinados

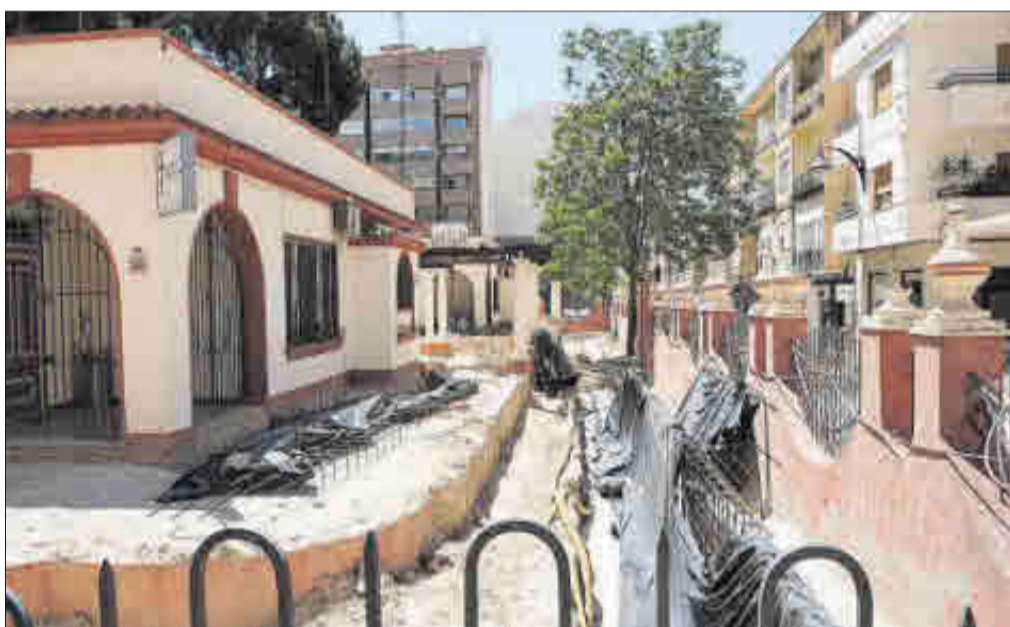

Las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy y de la plaza de la iglesia de Ibi siguen paradas, al igual que las plazas Joan Miró y el Jardín de la Música en Elda.

JUANI RUIZ / ÁXEL ÁLVAREZ

materiales debido a la actual crisis del sector de la construcción. En cuanto al carril bici y la pasarela a la playa de Urbanova, estaba ya elegida hasta la empresa pero renunció por precios y hay que hacer un proyecto nuevo. Lo mismo ha ocurrido con las pasarelas del Tossal.

En el Alto y Medio Vinalopó municipios como Petrer, Villena, Aspe y Elda se encuentran con proyectos paralizados, algunos sin empezar y otros a medio hacer, por el mismo problema. El caso más grave se ha producido en Elda después de que Sigma Infraestructuras, la adjudicataria de la reurbanización de la calle Ramón Gorgé y la reforma de la plaza Joan Miró y el Jardín de la Música, haya entrado en precurso de acreedores. El Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso para resolver los tres contratos que rondan los 2 millones de euros. Pero esta misma semana otra constructora con sede en La Nucía ha comunicado que renuncia a llevar a cabo la urbanización de las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas aún perdiendo el aval del 5% tras haber firmado un contrato con un montante de 1.829.288 euros.

En la comarca de l'Alacantí el proyecto estrella de Xixona, el pa-

bellón cubierto presupuestado en 4 millones, está bloqueado tras quedar desierta la licitación por el encarecimiento de los materiales después de pedir, sin éxito, las dos empresas que optaban a la contrata una actualización de precios. En El Campello la inversión de un millón de euros en el asfaltado de calles también está bloqueada al reclamar la adjudicataria una revisión; y en Mutxamel el Ayuntamiento acaba de reactivar la licitación del cuarto colegio por 4,4 millones tras confirmarle la Conselleria de Educación que el presupuesto se podrá revisar después para ajustarlo al nuevo precio.

San Vicente del Raspeig tiene ahora mismo paralizada la obra más importante de este mandato y del anterior, el pabellón polideportivo de 7,3 millones de euros. La UTE pidió la revisión de precios el verano pasado y desde noviembre la obra está parada. La empresa Sigma Infraestructuras, que debía reformar el Casal de la Festa, ha renunciado a la ejecución tras la complicada situación económica que atraviesa a consecuencia de la inflación. Mientras Aitana, la adjudicataria de la segunda fase de mejora del Auditorio del Centro Social ha pedido revisión de precios también y por el momento no ha fir-



JAVIER GISBERT
PRESIDENTE DE FOPE

«Nos arriesgamos a perder gran parte de las ayudas de la UE si la Administración no aporta soluciones»

mado el contrato. A su vez, Pavasal que tiene adjudicado el asfaltado de calles de San Vicente, y que pidió suspender el contrato y una revisión de precios, está desarrollando la actuación con el compromiso de que cuando finalice se efectuará dicha revisión, amparándose en el decreto ministerial del Gobierno central que ha aprobado medidas para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de precios de los materiales

En Alcoy el mismo problema ha retrasado las obras de remodela-

ción del instituto Andreu Sempere por un plazo indeterminado. El Ayuntamiento sacó la licitación en diciembre de 2021 por 3,72 millones de euros, dentro del Plan Edificant, pero lo ajustado del importe hizo que no se presentara ninguna oferta para ejecutar los trabajos. Educación se ha comprometido a incrementar la dotación económica del proyecto, lo que permitiría incluir actuaciones no previstas como el gimnasio y las pistas deportivas. No obstante, aún está a la espera. Además, tendrá que volver a pasar por pleno la delegación de competencias de la Generalitat en el Ayuntamiento para que la administración municipal ejecute la obra.

Otra actuación que se ha visto alterada por el encarecimiento de materiales es la reforma integral de la plaza de la Iglesia de Ibi. El presupuesto inicial era de 1.380.000 euros, de los que 1.051.000 se sufragaban a través de fondos europeos. Sin embargo, el aumento del precio del hormigón llevó a que tampoco aquí se presentara ninguna oferta. Los trabajos finalmente se han adjudicado por 1.987.000 euros, tras repetirse el proceso de licitación, y su inicio se prevé que sea inminente aunque aún no han comenzado.

De todas las obras que ha adjudicado el Ayuntamiento de Elche ninguna se ha tenido que paralizar por la inflación. No obstante, Aigües d'Elx está en negociaciones con la empresa a la que se le ha adjudicado las obras de la red agua potable y alcantarillado de la avenida de Cartagena, en la pedanía de El Altet, para decidir si empieza o renuncia.

En Almoradí se están quedando desiertos algunos contratos porque los presupuestos no contienen la subida de precios actual. Entre enero y abril las obras han sufrido retrasos por los problemas en el suministros de materiales aunque han podido continuar.

La poca obra pública que se está realizando en Torrevieja -un colegio- no se ha paralizado.

«En cualquier caso la Administración debe arrimar el hombro para buscar soluciones a este problema y debe hacerlo rápido. Ahora vienen a España miles de millones de euros de la Unión Europea y nos arriesgamos a perder buena parte de esas ayudas», advierte por último el presidente de FOPE.

HAN COLABORADO EN LA INFORMACIÓN
J.A. Rico, Juani Hernández, Victoria Mora, Antonio Teruel, Loreto Mármol, David Pamies y Ana Fajardo.
